

# Promemoria - Genomförande och samverkan kring myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Följande dokument har tagits fram med syfte att Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket ska vara enade i genomförande och samverkan i uppdraget kring myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering.

Dokumentet ska förankras på respektive myndighet och utgöra en riktlinje kring hur uppdraget ska genomföras under 2022–2024. Dokumentet beskriver övergripande genomförandet av uppdraget. Detaljerade beskrivningar samt tidplaner för respektive år ska tas fram i början av varje år för åren 2023–24. För arbetet under 2022 görs en tidplan i augusti 2022.

## Uppdraget

Myndigheterna har fått i uppdrag att göra en gemensam uppföljning av samhällets elektrifiering. Regeringen specificerar i sitt beslut tre övergripande underlag som ska ligga till grund för redovisningen av uppdraget. Mer information kring underlagen finns i uppdragsbeskrivningen<sup>1</sup>.

1. Kvalitetssäkrade gemensamma bedömningar av Sveriges totala elbehov till och med 2045. Även bedömningar av elsystemets förutsättningar att utvecklas i takt med elbehoven. Ansvariga: EM, Ei, SvK och TrV.
2. Uppföljning av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas i hela landet. Inklusiv statistik avseende laddinfrastruktur för vägtransporter samt metodutveckling för att kunna kvantifiera antalet icke-publika laddningspunkter i Sverige. Ansvarig: EM.
3. Sammanställning av slutsatser när det gäller elmarknadens utveckling. Även en uppföljning av arbetet med att halvera ledtider för nya elnät senast 2025. Ansvarig: Ei.

Ett ytterligare underlag nämns i uppdraget som ska beaktas men som inte behöver redovisas i den gemensamma uppföljningen.

- Uppföljning av transmissionsnätinvesteringar i projekt som har tagits upp i tidigare års investerings- och finansieringsplaner som avslutats under 2023 respektive under 2024. Ansvarig: SvK.


EM är utsedd till samordnare för uppdraget som helhet.

---

<sup>1</sup> [Uppdrag att genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering - Regeringen.se](#)

## Genomförande

Uppdraget genomförs i en organisation bestående av deluppdrag, samordningsgrupp samt en chefsgrupp, enligt Figur 1. Underlagen utarbetas i olika deluppdrag och levereras in resultat till samordningsgruppen som ansvarar för en samlad bedömning av underlagen. Underlagen och den samlade bedömningen fastställs av en chefsgrupp. Därefter beslutar EM:s GD om leveransen till RK.

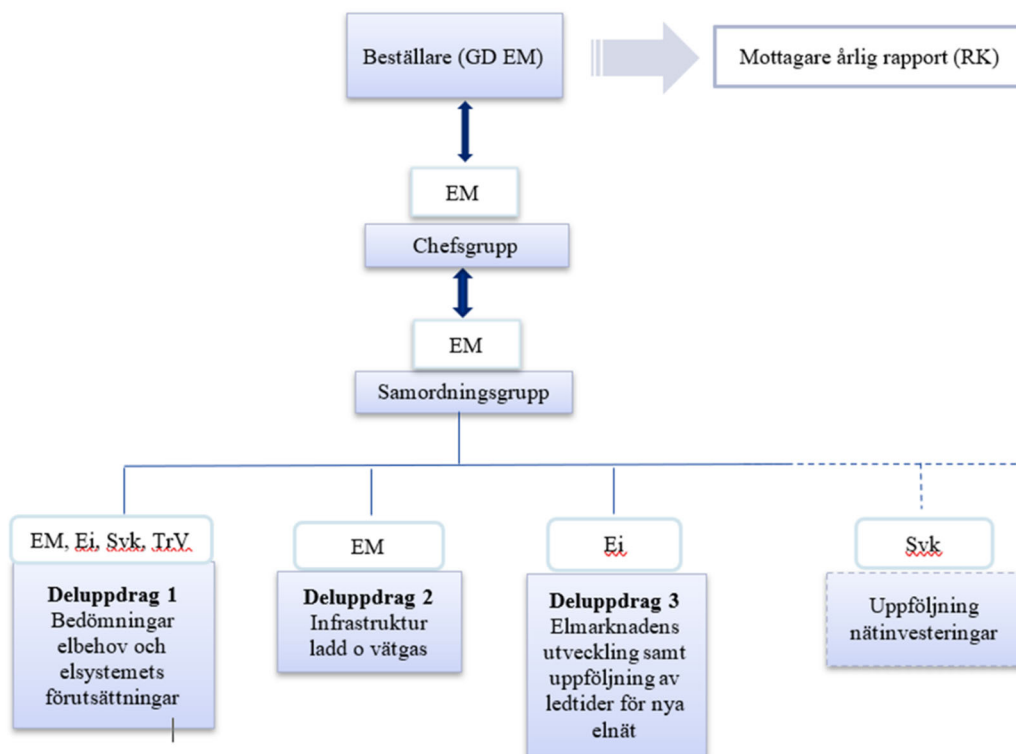

Figur 1 Organisation för genomförande av uppdraget

## Gemensamma principer för samverkan

### Övergripande i uppdraget

Följande principer gäller övergripande för ingående myndigheter i uppdraget:

- Myndigheterna ska avsätta resurser för att bidra med kompetens utifrån sina respektive sak- och ansvarsområden.
- Myndigheterna ska ta fram tidplaner i deluppdrag som är anpassade efter att den årliga rapporten kan färdigställas i tid.
- Myndigheterna ansvarar för att en intern förankring sker löpande under arbetets gång, i deluppdrag såväl som övergripande.

### **Arbetet i deluppdragen**

Underlagen tas fram i respektive deluppdrag där ansvarig myndighet leder arbetet. Samverkan sker kontinuerligt i uppdraget mellan ingående myndigheter och andra berörda aktörer. Ansvarig myndighet sammanställer underlagen och ansvarar för att redogöra för då myndigheterna eventuellt gjort olika bedömningar och ange skälen därför.

Myndigheterna har i sina ordinarie verksamheter olika expertområden där varje myndighet besitter olika kompetenser i relation till uppdraget, och det kan därför vara svårt för en myndighet att värdera eller ta ställning till en annan myndighets bedömning och ställningstagande i enskilda frågor. Vid sådana osäkerheter kan en reservation eller annan kommentar ges i inledningen av huvudrapporten. Det kan också framgå i respektive deluppdrag att en myndighet avstår från att göra ett ställningstagande i någon del. Deluppdragen ansvarar för att rapportera in resultaten från respektive deluppdrag till samordningsgruppen.

Nedan listas vad som gäller specifikt för respektive underlag och deluppdrag.

**Deluppdrag 1:** Kvalitetssäkrade gemensamma bedömningar av Sveriges totala elbehov till och med 2045. Även bedömningar av hur elsystemets förutsättningar utvecklas i takt med elbehoven. Underlaget ska tas fram av EM, SvK, Ei och TrV. EM leder arbetet i gruppen. EM kallar till möten, för minnesanteckningar och ansvarar för leveransen till samordningsgruppen.

**Deluppdrag 2:** Uppföljning av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Inklusiv statistik avseende laddinfrastruktur för vägtransporter samt metodutveckling för att kunna kvantifiera antalet icke-publika laddningspunkter i Sverige. Underlaget ska tas fram av EM, med stöd av TrV, där EM är ansvarig för leveransen.

**Deluppdrag 3:** Sammanställning av slutsatser när det gäller elmarknadens utveckling. Underlaget ska tas fram av Ei. I deluppdrag 3 ska dialog föras med SvK och EM men det är Ei som sammankallar och ansvarar för leveransen till samordningsgruppen. Ei ska även i deluppdraget göra en uppföljning av arbetet med att halvera ledtider för nya elnät senast 2025.

**Svk:s uppdrag:** Uppföljning av transmissionsnätinvesteringar i projekt som har tagits upp i tidigare års investerings- och finansieringsplaner som avslutats under 2023 respektive under 2024. Detta underlag ska beaktas men behöver inte redovisas. SvK är ansvarig och driver detta deluppdrag.

### **Beskrivning av uppdragets organisation**

#### **Samordningsgrupp**

Samordningsgruppen består av samordnare från respektive myndighet samt ansvarig person för deluppdrag 1–3. Samordnaren är myndighetens kontaktperson i uppdraget. Samordningsgruppen följer kontinuerligt upp arbetet i

deluppdragen och fångar upp övergripande frågeställningar.

Samordningsgruppen tar emot leveranser från respektive deluppdrag och ansvarar för att ta fram den årliga rapporten (enligt ambitionsnivån för olika år, se nedan). EM leder arbetet i samordningsgruppen, kallar till möten och för minnesanteckningar.

### **Chefsgrupp**

Chefsgruppen består av chefer, eller motsvarande, från respektive myndighet. Chefsgruppen är ansvarig för att säkra resurser för deltagande i uppdraget samt att förankra innehållet i den årliga rapporten inom sin egen myndighet.

Ambitionen är att konsensus ska nås genom samverkan, men om det skulle finnas frågor som myndigheterna inte är överens kring ska det framkomma i rapporten. Om frågeställningarna är av principiell karaktär och inte kan lösas i samordningsgruppen så kan dessa skickas vidare till chefsgruppen. EM leder arbetet i chefsgruppen.

### **Rapportering till RK**

EM ansvarar för att besluta och leverera den årliga rapporten till RK.

### **Mötesformalia**

EM kallar till samordningsmöten. Mötena sker digitalt via Teams om inget annat överenskommit. EM skriver minnesanteckningar.

### ***Ambitionsnivå för arbetet***

Ambitionsnivån kommer att trappas upp successivt under de tre år som uppdraget fortlöper.

Ambitionsnivån för den årliga rapporten kan graderas i tre olika nivåer:

1. samtliga deluppdrag sammanställs till en samlad redovisning
2. sammanvägd analys av samtliga deluppdrag och en samlad bedömning görs av elektrifieringen utifrån de olika deluppdragen
3. sammanvägd analys av samtliga deluppdrag och ev. andra underlag som bedöms av värde och en samlad bedömning görs av samhällets elektrifiering

Ambitionsnivån för rapporten kommer att öka under uppdragets gång:

- Årlig rapport 2022: ambitionsnivå 1-2
- Årlig rapport 2023: ambitionsnivå 2-3
- Årlig rapport 2024: ambitionsnivå 3

Det kan vara lämpligt att vid något tillfälle informera GD för berörda myndigheter samlat om arbetet med uppdraget. Det kan t.ex. finnas behov av att stämma av kring vissa frågor och vägval, där separata möten för detta kommer att bokas in.

***Samverkan med andra myndigheter och organisationer***

Samverkan ska enligt direktivet i relevanta delar ske med Trafikanalys, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Verket för innovationssystem, Gotlands kommun och regionerna samt med relevanta bransch- och intresseorganisationer.

Sådan samverkan kan ske på olika nivåer i arbetet: på myndighetsnivå, i deluppdragen och på samordnad nivå vid behov. Uppdraget bör även samverka med andra relevanta regeringsuppdrag. Samverkan i uppdraget följs upp och diskuteras vid samordningsgruppens möten.
